



國立成功大學營繕工程說明

總務處 杜簡任技正 明河

總務處・營繕組・2012

營繕工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
1	成功校區東側教學舍後期更新整建工程 (材料、資源及資訊三系館)	截至101年9月18日其分項建築工程預定進度75.61%，實際進度61.63%。	徐家偉 賴俊允
2	數位設計教學大樓新建工程	預計10月1日建造核發後公告。	吳易儒 陳志明
3	生物科技教學大樓新建工程	101年3月7日技術服務廠商決標，101年4月26日函送30%初步設計報告書審議，行政院工程會於101年8月27日函復同意。	陳建邦 黃照仁
4	海工教學大樓新建工程	已於101年7月19日辦理評選會議完成，第一優勝者為群牲聯合建築師事務所。平面空間及立面預計10月3日定案後，製作30%規劃設計報告書。	吳易儒



成功校區東側教學舍後期更新整建工程
(材料、資源及資訊三系館)



數位教學科技大樓





生物科技教學大樓



海工教學大樓新建工程

總務處・營繕組・2012

營繕工程說明表


項次	案名	進度	承辦人
5	市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程	於101年12月30日決標，101年3月9日開工，預定進度44.79%，實際進度37.50%	楊淑媚
6	成功校區格致堂東西側景觀及排水改善工程	於100年5月16日決標，7月4日開工，施工中。	劉昭慧
7	光二舍寢室及公共空間整修工程(第一期)	於101年6月21日決標，排定初驗程序中。	賴俊允
8	中正堂耐震補強工程	於101年5月16日決標，預定進度85%，實際進度80%，結構補強已部分驗收。剩餘外油漆等裝修及復原工作。	陳建邦



市定古蹟原日軍臺南衛戍
病院講堂(臺文系多功能教
學講堂)修復工程

成功校區格致堂東西側
景觀及排水改善工程




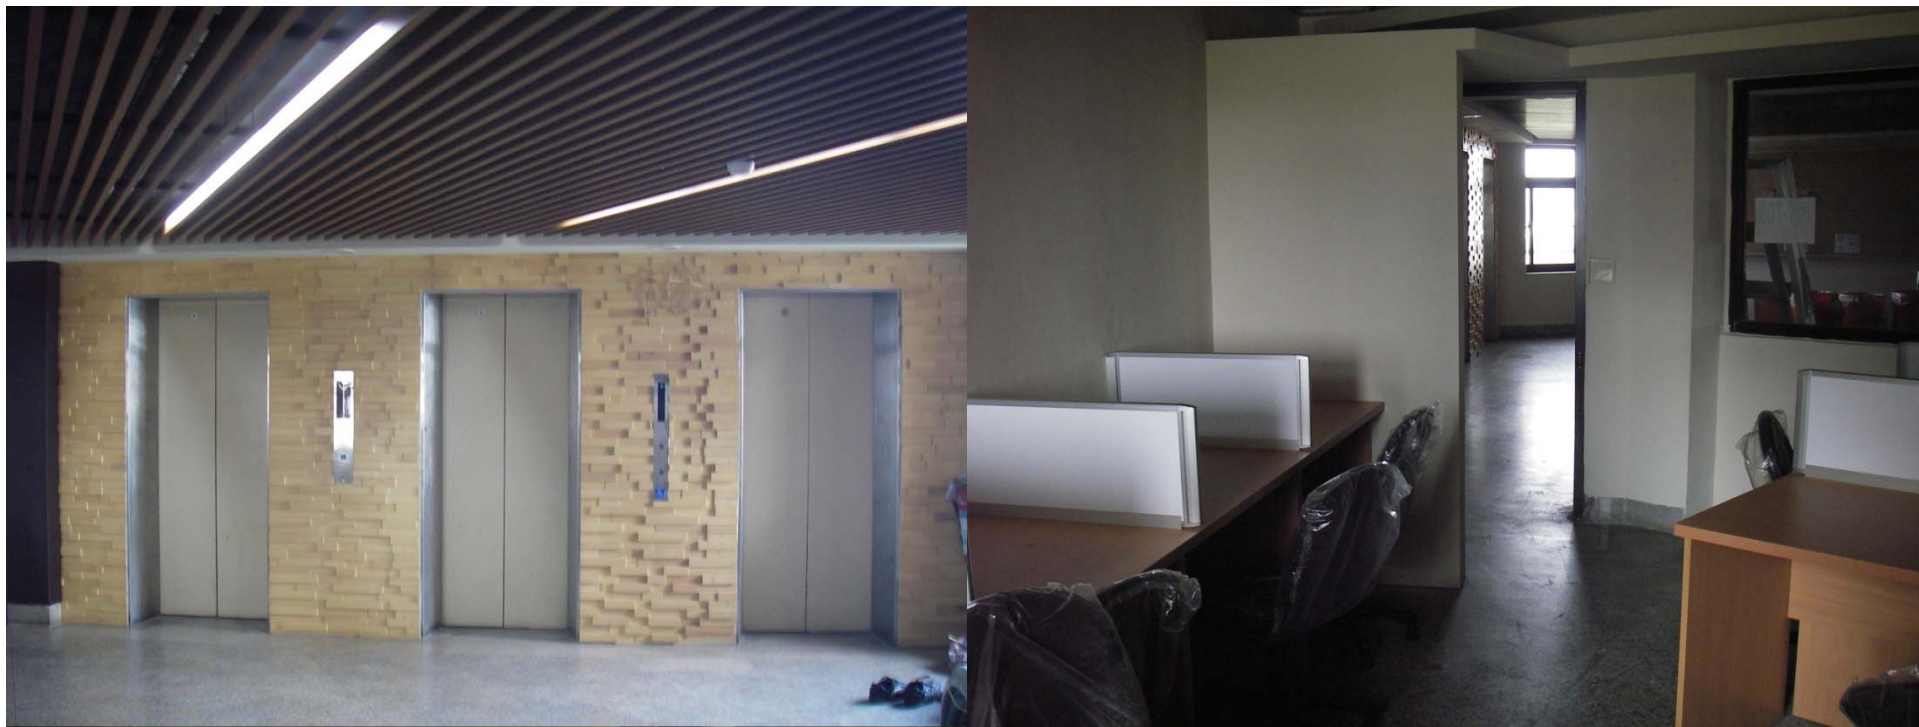

光二寢室及公共空間整修工程（第一期）



中正堂耐震補強工程

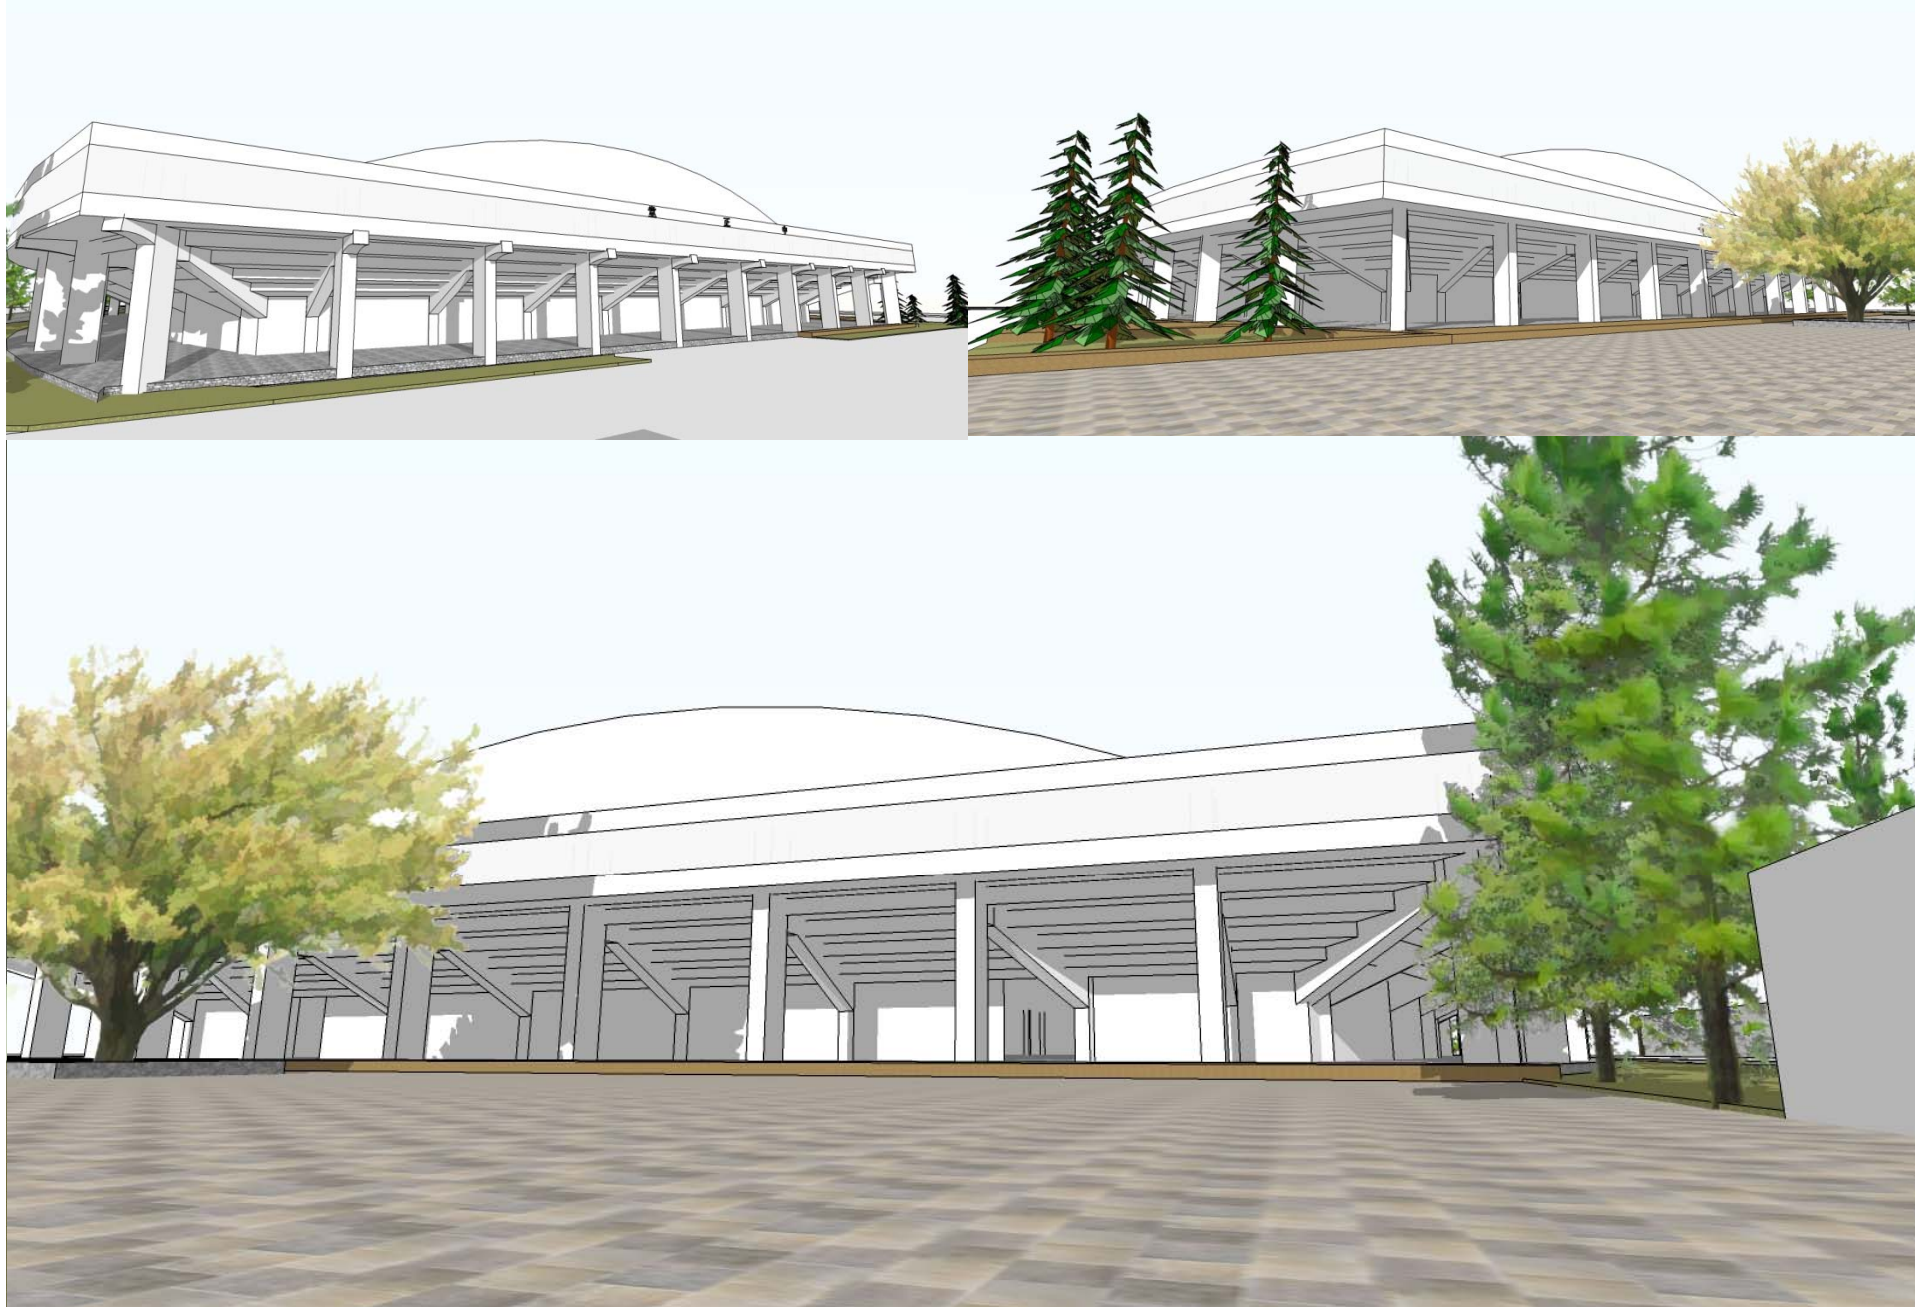

營繕工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
9	綜合大樓耐震補強工程	100年7月6日決標，預定進度100%，實際進度98%，格柵施工及景觀復原。	陳建邦
10	焚化爐改爲MRI設備空間結構體工程	於100年9月28日決標，101年9月6日部分竣工，預計101年9月26日部分初驗。	陳建邦
11	規劃與設計學院協同駐校建築師創意實驗改造工程	於100年11月30日決標，結案中。	葉家綺
12	歸仁校區衛星推進系統實驗室新建工程	於100年12月28日決標，定進度100%，實際進度92%，防水、外構工程。	賴俊允





▲規劃與設計學院偕同駐校建築師創意實驗改造工程

▼歸仁校區衛星推進系統實驗室新建工程



營繕工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
13	護理系館無障礙電梯新建及相關友善環境整修工程	於100年11月23日決標，截至101年7月5日預定進度100%，實際進度100%，結案中。	賴俊允
14	綠建築多功能教室裝修工程	截至101年9月21日，預定進度100%，實際進度98.37%，目前申請消防變更及室內裝修許可。	徐家偉
15	物理系舊館北棟外走廊天花板及防水修繕工程	於100年12月14日決標，完工。排定正驗中。	賴俊允
16	前瞻醫療器材科技中心整修工程	於101年1月4日決標，已驗收完成、結案中。	陳建邦
17	MRI設備空間裝修及機電工程	101年2月15日決標，預計進度21.2%，實際進度20%。。	陳建邦 高龍峻
18	醫學中心基礎醫學大樓動物實驗室空間整修工程	於101年2月21日決標，截至101年9月16日竣工。	楊淑媚
19	工資管系東側污水設施及廁所整修工程	於100年5月2日決標，結案中。	葉家綺

營繕工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
20	工資館系更換發電機設備	於101年5月23日決標，已結案。	莊輝明
21	勝四舍及勝六舍冷氣設備電源增設工程	於101年6月27日決標，預定進度100%，已報竣工，排初驗程序中。	黃照仁
22	化工系館屋頂空間衍架及安全防護網整修工程	於101年6月13日決標，已結案。	陳志明
23	硫化反應排煙櫃系統	於101年6月13日決標，廠製作業中。	賴俊允
24	綠建築科技大樓隔間工程	於101年8月29日完成驗收，已結案。	徐家偉
25	拖航水槽地下1樓柱體整修工程	於101年6月21日決標，101年9月12日驗收完成，結案中。	陳志明
26	衛戍病院消防設置工程	於101年6月27日決標。初驗複驗中	王正雄
27	研究總中心暨行政大樓中庭鋼架玻璃整修工程	於101年6月27日決標，101年9月19日驗收完成，結案中。	陳建邦
28	醫學檢驗生物技術學系電力增設工程	於101年7月11日決標。施工中。	莊輝明

規劃設計作業說明表

項次	案名	進度	承辦人
1	成功及勝利校區道路改善工程	汪裕成建築師規劃設計；設計作業中。	劉昭慧 林純德 高龍峻
2	禮賢樓屋面及天花板緊急修復	石昭永建築師規劃設計；設計審查作業中。	賴俊允
3	國定古蹟工設系教學空間修復工程	建築師規劃設計；現場調查及基本設計中，預定11月初提送審查。	葉家綺
4	臺南市市定古蹟原臺南高等工業學校校舍之格致堂修復工程	101/6/27議價決標，陳智宏建築師規劃設計；設計調查作業中。	吳易儒
5	禮賢樓整修	石昭永建築師規劃設計；設計調查作業中。	賴俊允
6	小東門殘垣修復工程	石昭永建築師規劃設計；於101年9月21日召開審查委員會議。	徐家偉
7	管理學院演講廳整修工程	吳俊賢建築師規劃設計；公告中，10月3日開標。	葉家綺

成功及勝利校區道路改善工程





禮賢樓



大成館（工設系）


校內古蹟修復工程



格致堂



小東門殘垣修復工程

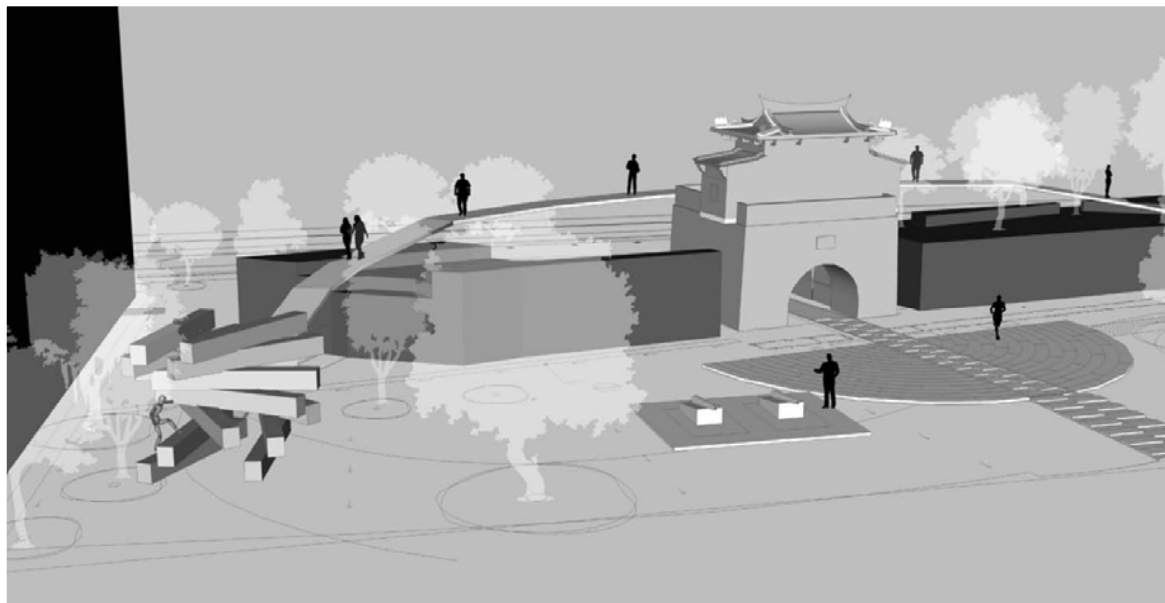

小東門殘垣修復工程





管理學院演講廳整修工程

規劃設計作業說明表

項次	案名	進度	承辦人
8	會計系研究討論空間整修工程	聯合打開建築師規劃設計；施工中，預計竣工日期101年9月24日。	徐家偉 陳志明
9	化工系館外牆及屋頂防水隔熱整修工程	歐文雄建築師規劃設計；採購預算書圖備查；待經費。	陳志明
10	航太系頂樓防水隔熱工程	蔡明烈建築師規劃設計；採購預算書圖備查；待經費。	吳易儒 陳志明
11	藝術中心空間整修工程	聯合打開建築師規劃設計；8月29日開標，目前正在施工中。	葉家綺
12	軍訓室屋頂漏水整修工程	陳冠州建築師規劃設計；採購書圖修訂中。	葉家綺
13	化工系管道間安全網	林博容建築師規劃設計；採購書圖作業中。	陳志明
14	土木系結構材料實驗室屋頂滲漏水修繕	陳冠州建築師規劃設計；待經費。	劉昭慧
15	醫工所空間增設委託規劃設計監造	李灼明/董啓真建築師規劃設計；8月21日核發建造執照，已公告，預計10月3日開標。	吳易儒

規劃設計作業說明表

項次	案名	進度	承辦人
16	舊總圖結構補強	聯合打開建築師規劃設計；以新法規重新評估中。	陳建邦
17	理化大樓結構補強	經公告採購無廠商投標，洽石昭永建築師規劃設計(尚未允諾簽約)。	陳建邦
18	學生活動中心廁所整修	吳俊賢建築師規劃設計；採購書圖已核備。待經費。	葉家綺 戴正義
19	學生活動中心補強暨雨遮	張瑪龍建築師規劃設計；已提送書圖審查中。	楊淑媚
20	歸仁校區校名指標2期工程	蔡明烈建築師規劃設計；雜項執照申請中。	吳易儒 黃品智
21	海洋生物及鯨豚研究中心周邊景觀整工程	林和慶建築師規劃設計；施工中。	劉昭慧
22	自強校區污水及道路改善	蔡明烈建築師規劃設計；公告中。	黃品智 陳志明
23	勝一舍屋頂防水整修工程	歐文雄建築師規劃設計；公告中，9月26日開標。	葉家綺
24	芸青軒整修工程	技術服務評選採購作業中。預計9月25日上網公告。	吳易儒

藝術中心空間整修工程 ↓



學生活動中心廁所、補強暨雨遮整修工程 →




海洋生物與鯨豚研究中心周邊景觀整修工程



芸青軒整修工程

先期規劃構想書說明表

項次	案名	進度	承辦人
1	游泳池及球類場館新建工程	100年12月6日函報構想書(定稿本)，經教育部審查同意，於100年12月12日核轉行政院公共工程委員會辦理審議。100年12月23日教育部轉修工程會審查意見，本校於101年2月1日函復。101年2月17日教育部再核轉工程會審查意見，經101年4月19日再次送行政院公共工程委員會辦理審議，5月3日教育部函轉審查意見要求再補充說明。目前會同體育室及建築系簡聖芬助理教授研提回復說明及補充資料作業中。	劉昭慧
2	理學教學大樓新建工程	使用空間單位基本位面積與規定不符，待薛丞倫老師修訂面併調整總預算後送教育部審議。	賴俊允

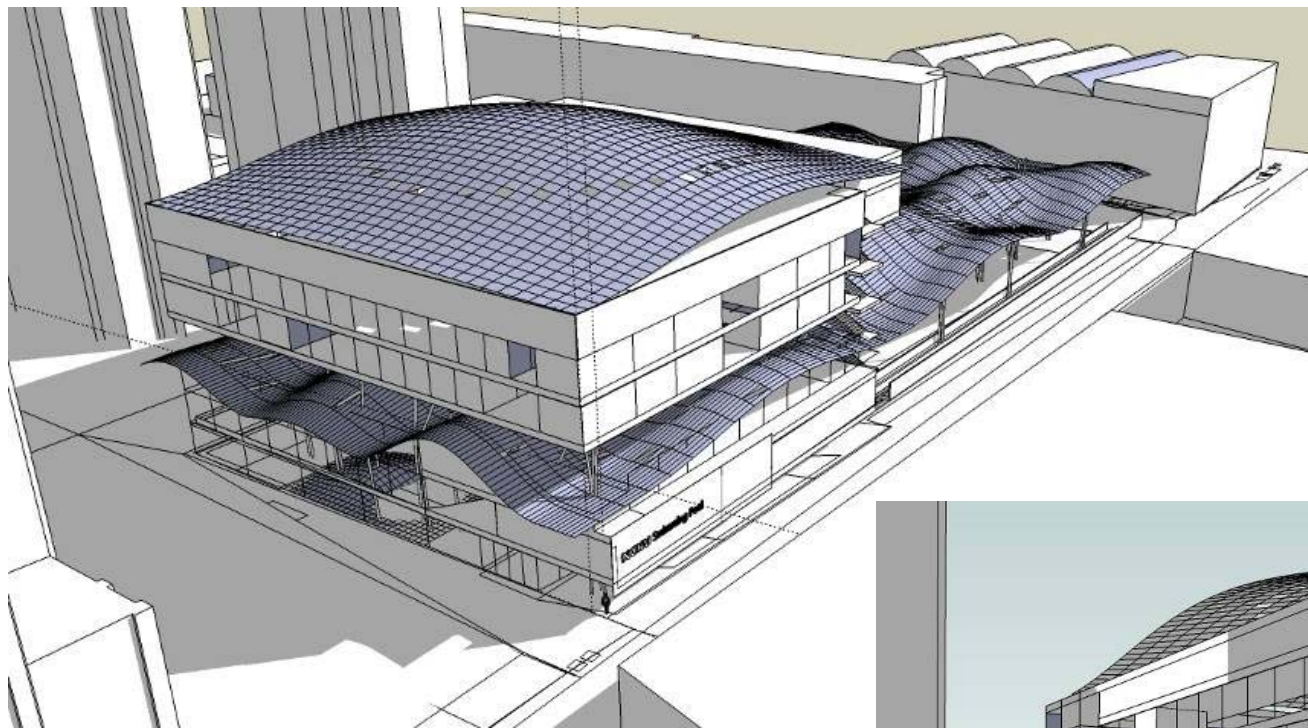

量體高度模擬 I

量體高度模擬 II



游泳池及球類場館新建工程量體模擬示意圖



西側臨勝利路

理學教學大樓新建工程量體模擬示意圖



理學教學大樓新建工程量體模擬示意圖

已完工之工程案表

項次	案名	完工日期	承辦人
1	力行校區資源回收場鋪面及排水整繕工程	已結案	賴俊允
2	核心實驗室儀器設備採購	已結案	葉家綺
3	都市計畫系聯展工作坊實習教室整修工程	已結案	徐家偉
4	東寧宿舍區停車場整繕(含圍籬設置)工程	已結案	賴俊允
5	成功校區測量系館北側外牆整修工程	已結案	劉昭慧
6	勝五舍及化學館供電備援工程	已結案	黃品智
7	魔法學校生態園藝教學設施新建工程	已結案	徐家偉
8	理化大樓外牆磁磚整修工程	已結案	陳建邦
9	水工試驗所大型平面水池試驗鋼構油漆工程	已結案	葉家綺
10	汰換光復校區南側高壓纜線工程	已結案	黃品智



已完工之工程案表

項次	案名	完工日期	承辦人
11	建築系屋頂防水工程	已結案	陳建邦
12	機械系外牆磁磚整修工程	已結案	劉昭慧
13	台文、建築、工設系教學空間電力改善工程	已結案	李明容
14	數位設計教學大樓地質鑽探工程	已結案	吳易儒
15	數學、測量系教學空間電力改善工程	已結案	李明容
16	化工系館屋頂空間衍架及安全防護網整修工程	已結案	陳志明
17	儀器設備中心大樓微奈米中心實驗室空調增設工程	已結案	高龍峻





▲魔法學校生態園藝教學設施新建工程

▼建築系屋頂防水工程





外牆整修工程



建築系



建築系

↑ 勝五舍及化學館供電備援工程

← 台文、建築、工設系教學空間電力改善工程



台文系



台文系

電力設備工程

成功大學校園未來展望

- ∞ 體現生命價值與意義的 安全校園
- ∞ 共生共榮、尊重人權之 友善校園
- ∞ 落實節能減廢之綠環境 永續校園
- ∞ 致力於重現歷史紋理之 文化校園
- ∞ 提供適合學術活動產出之 創意校園
- ∞ 建構足以提高行政效能之 數位校園



簡報結束，敬請指教
