



國立成功大學營繕工程說明

校內重要工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
1	成功校區東側教學舍後期更新整建工程(材料、資源及資訊三系館)	整體工程進度 96% 。資源系已遷入使用，材料系、資訊系驗收完成，入續辦理搬遷作業中。	陳建邦 李明容 高龍峻
2	數位設計教學大樓新建工程	施工中，實際進度 96% ，預定 103年3月 完工	賴俊允 黃品智
3	生物科技教學大樓新建工程	施工中，目前進度 2.4% ，預定進度 1.9% 。預定 105年5月25日 完工	陳君達 黃照仁
4	海工教學大樓新建工程	實際進度 0.376% ，預計進度 0.445% ，預定 105年9月18日 完工。	吳易儒 王正雄
5	勝利校區游泳池及球類場館	30% 初步設計報告書送教育部審議完成。預計 5月 完成都市設計審議。	葉家綺 王逢祺
6	理學教學大樓新建工程	細部設計檢討中。	陳君達 莊輝明



成功校區東側教學舍後期更新整建工程 (材料、資源及資訊三系館)





數位設計教學大樓



生物科技教學大樓



海工教學大樓新建工程





游泳池及球類場館新建工程



理學教學大樓新建工程量體模擬示意圖




校園開放空間及公共建築工程說明表


項次	案名	進度	承辦人
1	成功及勝利校區道路改善工程	除警衛室以外，廣場已完成，預計103年2月28日完工。	楊順宇
2	工學大道排水系統整修工程	第一期工程正在施工中。目前進度17%。	葉家綺
3	校本部環境影響評估	環評說明書於環保署程序審查中。	楊順宇
4	芸青軒整修工程	施工中，實際進度80%，預計103年3月17日完工。	吳易儒
5	光復校區歷史系及中文系周邊景觀工程	規劃設計中。預計辦理公聽會。	葉家綺
6	東寧校區學生宿舍興建計畫	已送第二期修正先期規劃構想書於教育部審議中。	楊淑媚



成功及勝利校區道路改善工程

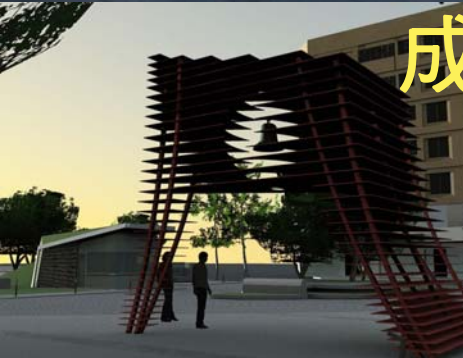

成大校鐘基座

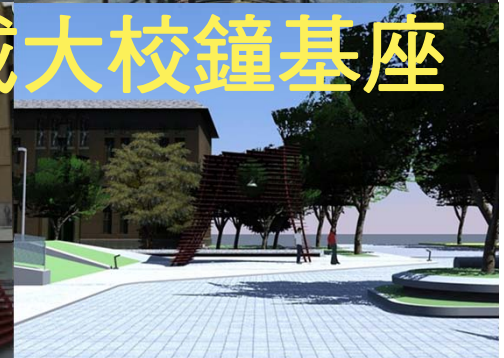

工科系館前廣場3D示意



資訊系館前廣場3D示意

成大工學路景觀設計



資源系館前廣場3D示意




材料系館前廣場3D示意



芸青軒整修工程



光復校區歷史系及中文系周邊景觀工程

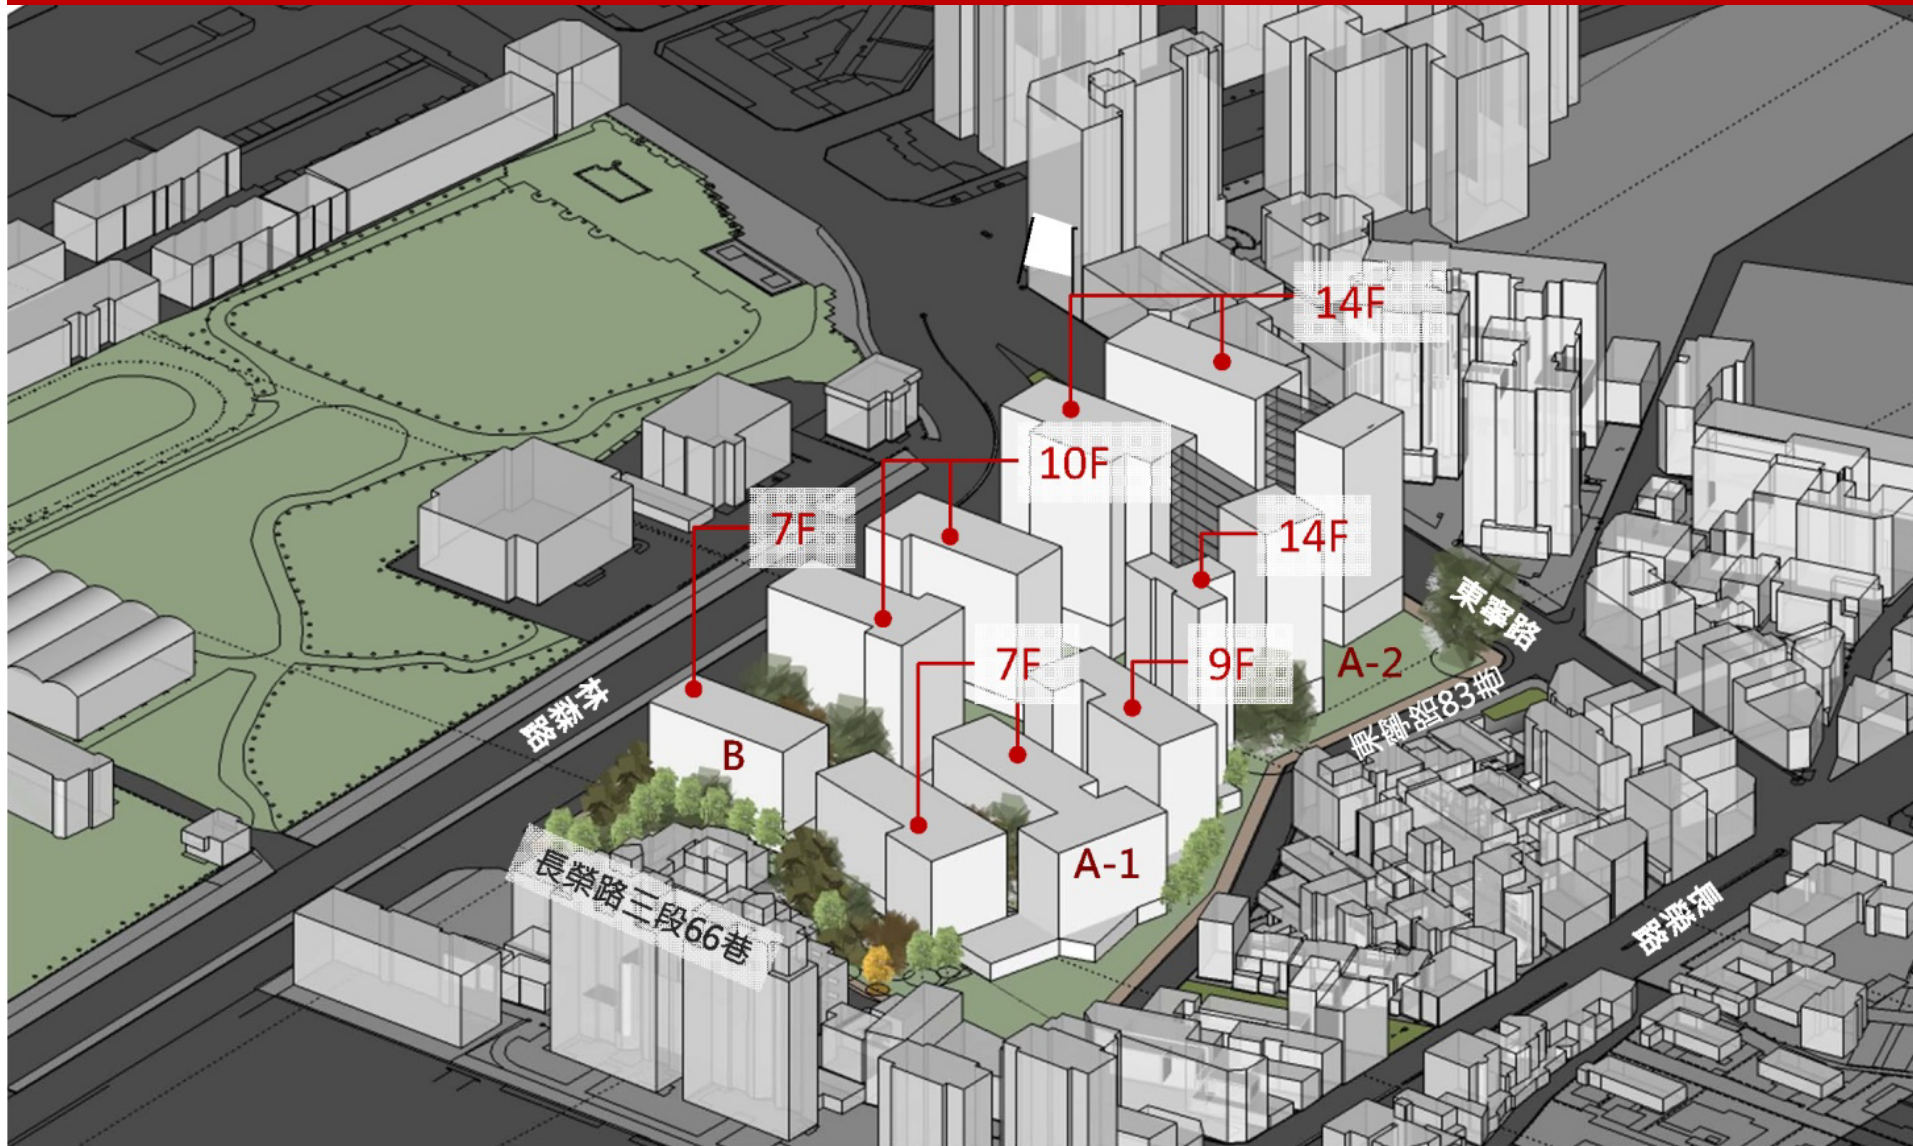

東寧校區學生宿舍興建計畫

新設藥學系目前設置
於醫學院6樓

附設醫院
醫療大樓

醫學院
教學大樓

醫學檢驗
生物技術學系

成杏
校區

成杏廳

護理
系館

物治系館
職治系館

校園新設學系-藥學系目前設置地點



校園活動空間預計修繕工程-光復南排球場



校園活動空間預計修繕工程---活動中心前木舞台



校園活動空間預計修繕工程---

活動中心地下一樓舞蹈教室木地板




校園活動空間預計修繕工程---自強校區北側木舞台

■ 順應無車校園，創造人本環境

- 全校區汽車停車場整體考量、統一管理。
- 配合調整停車位
 - 取消原有地面層260機車停車位
 - 成功地下停車場汽車車位改為機車車位，預計可增加523機車停車位。




成功校區地下停車場

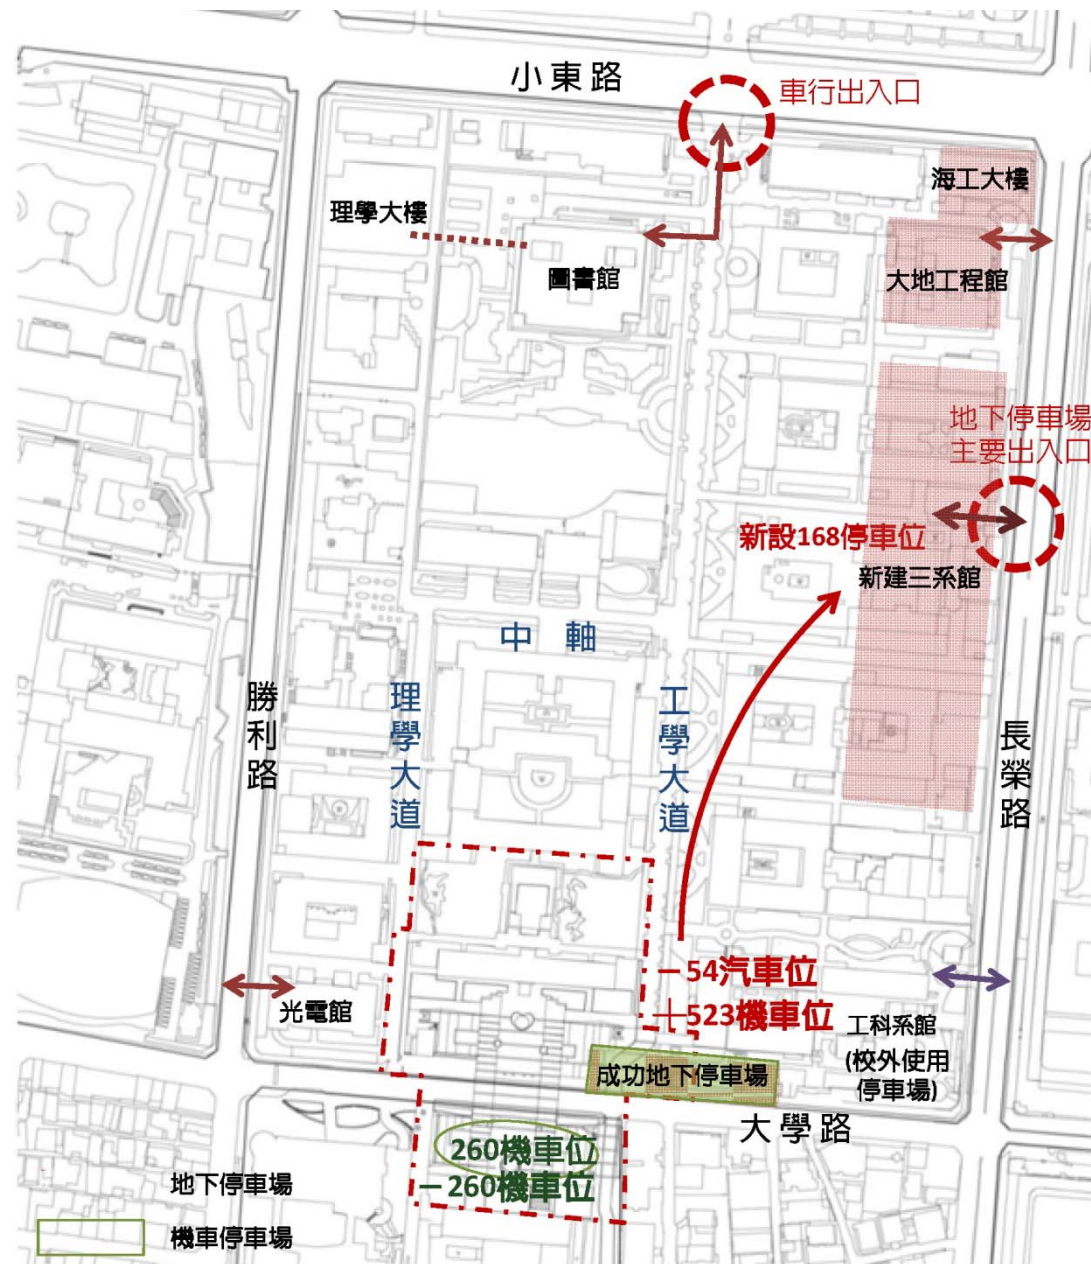

校園停車規劃---成功-勝利廣場汽、機車停車規劃

■ 停車計畫說明-改善

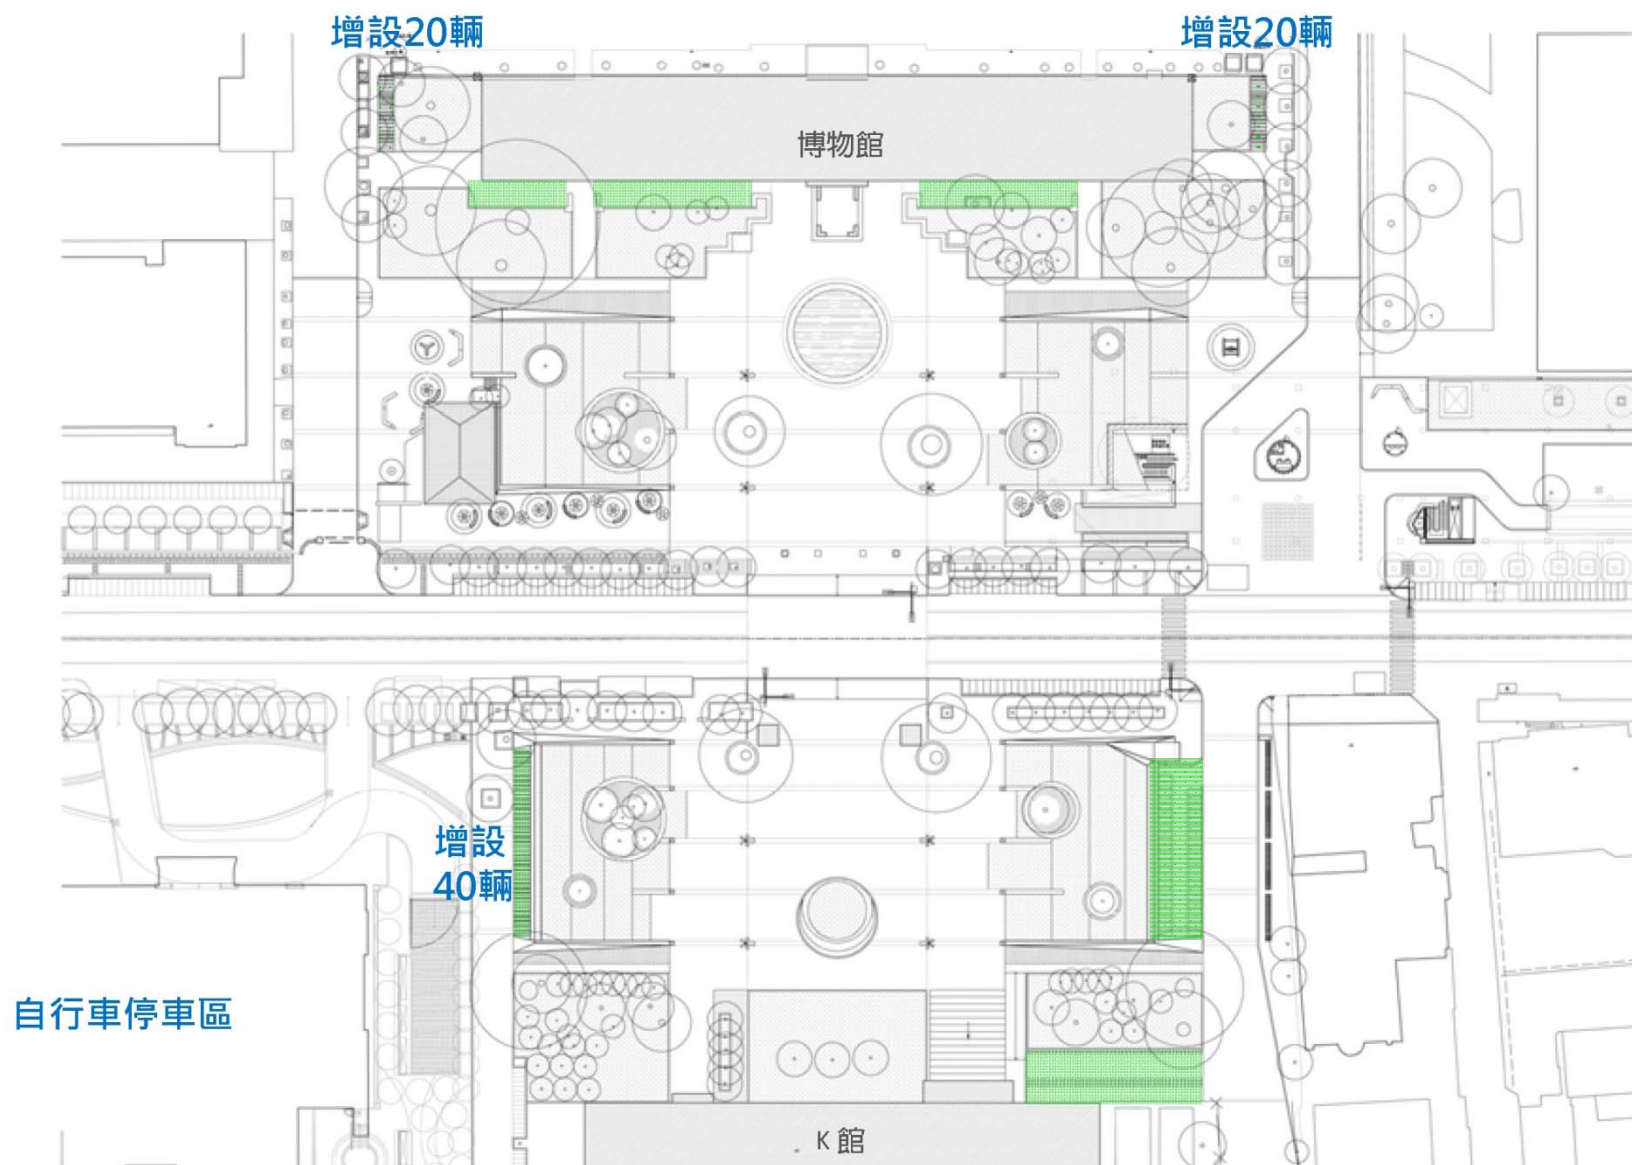


校園停車規劃---成功-勝利廣場自行車停車規劃



本次工程範圍內地上物移除說明:

- 1.大喬木計9類,編號#4及#5板配合校方及監造單位指示根剪修平整
- 2.RC電桿2支移除
- 3.現有機車棚架拆除(拆後棚架鐵件需交由校方並依指示位置堆放)及RC地坪打除運棄
- 4.現況埋入式廢棄水塔敲除
- 5.A區範圍之地坪配合重鋪地坪高程,重新整地
- 6.B區範圍之地坪除現有機車棚RC地坪敲除外,其他尚有RC地坪之處一律配合重鋪地坪敲除至所需高程

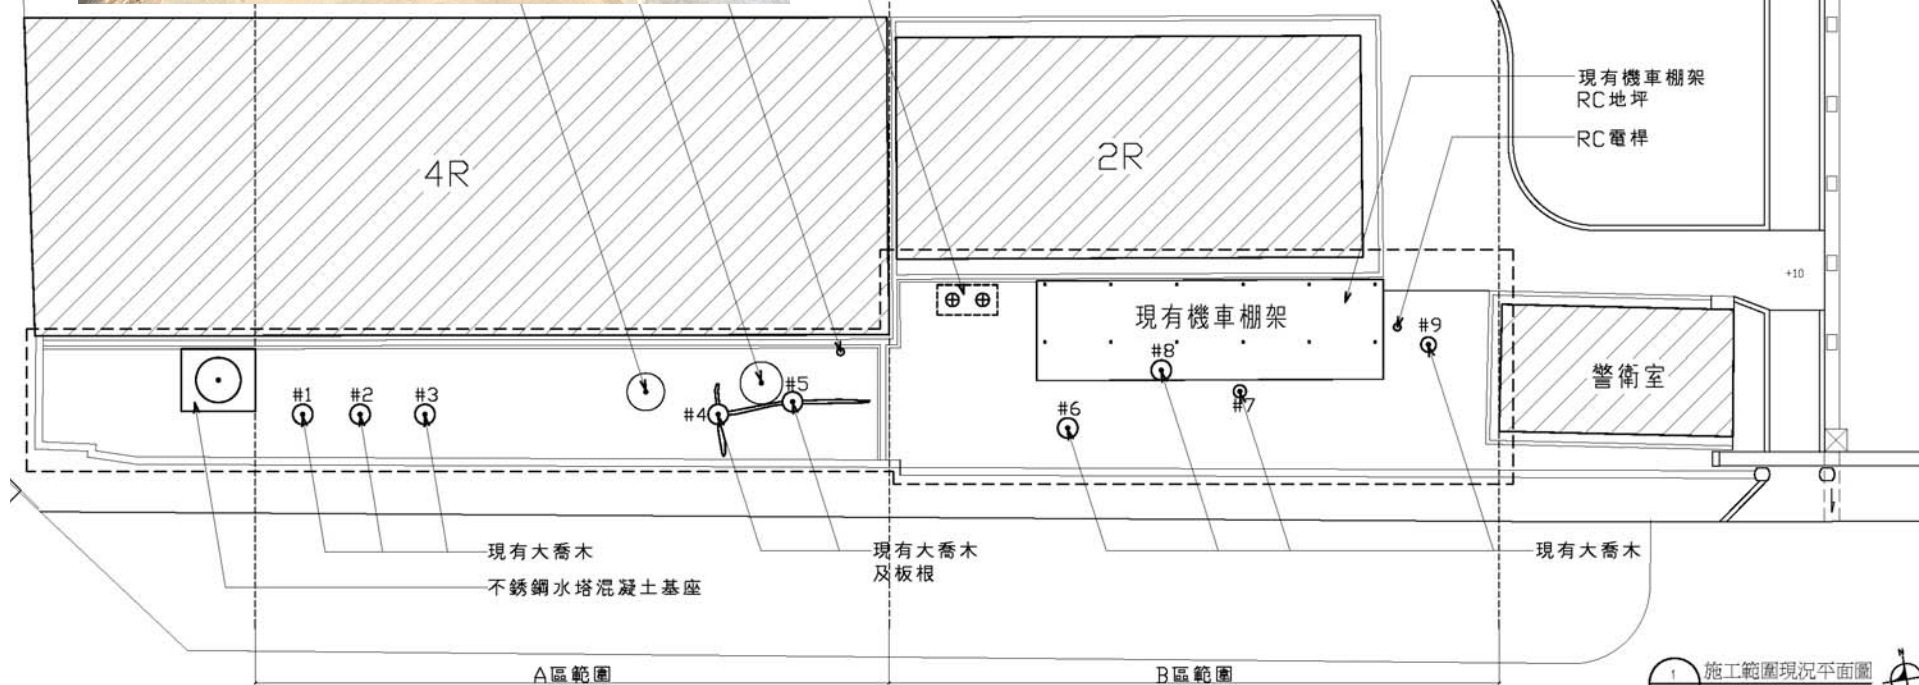


校園停車規劃---力行校區機車停車規劃



本次工程範圍內地坪鋪面說明:

- 1.A區範圍之地坪重鋪RC地坪(詳圖一)
- 2.B區範圍之地坪重鋪連鎖磚地坪(詳圖二)
- 3.本案重鋪連鎖磚之磚材料由校方供給,其擺置地點位於力行校區北側停車場上,磚材質原則上已整理推置整齊,故本次承包商須負責載運至本次工區範圍內鋪設

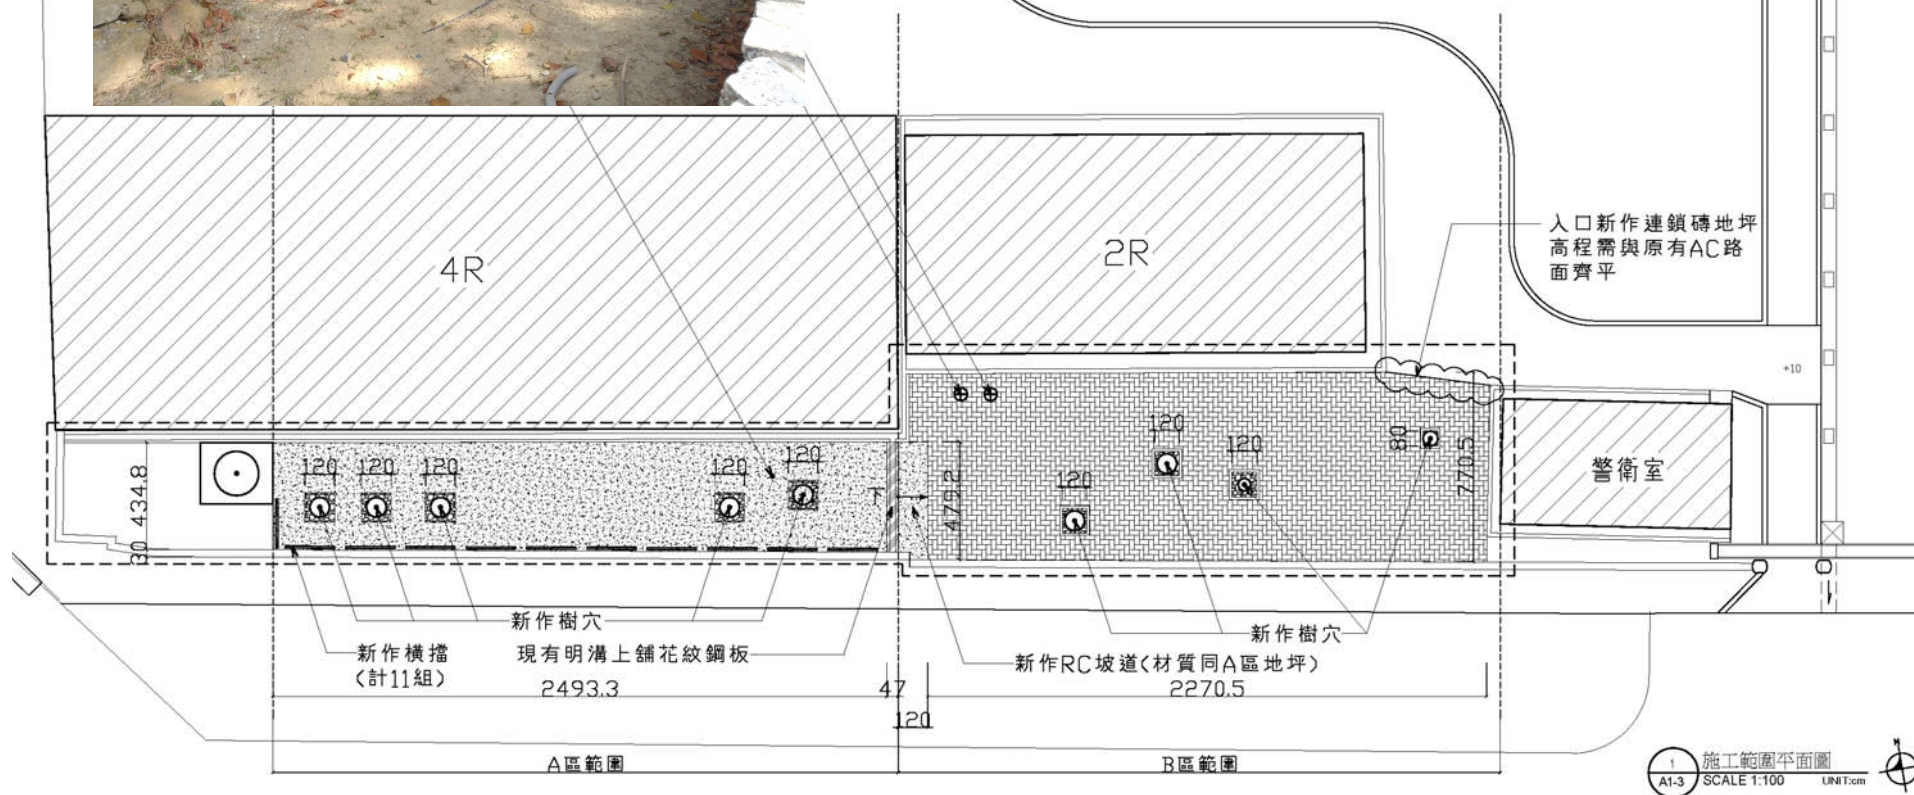


校園停車規劃---力行校區機車停車規劃

基地現況

- (一) 基地位置：勝利路中軸人行及自行車道。
- (二) 改善需求：1. 順平人行道。
2. 增設自動柵欄機。



勝利路中軸景觀改善提案

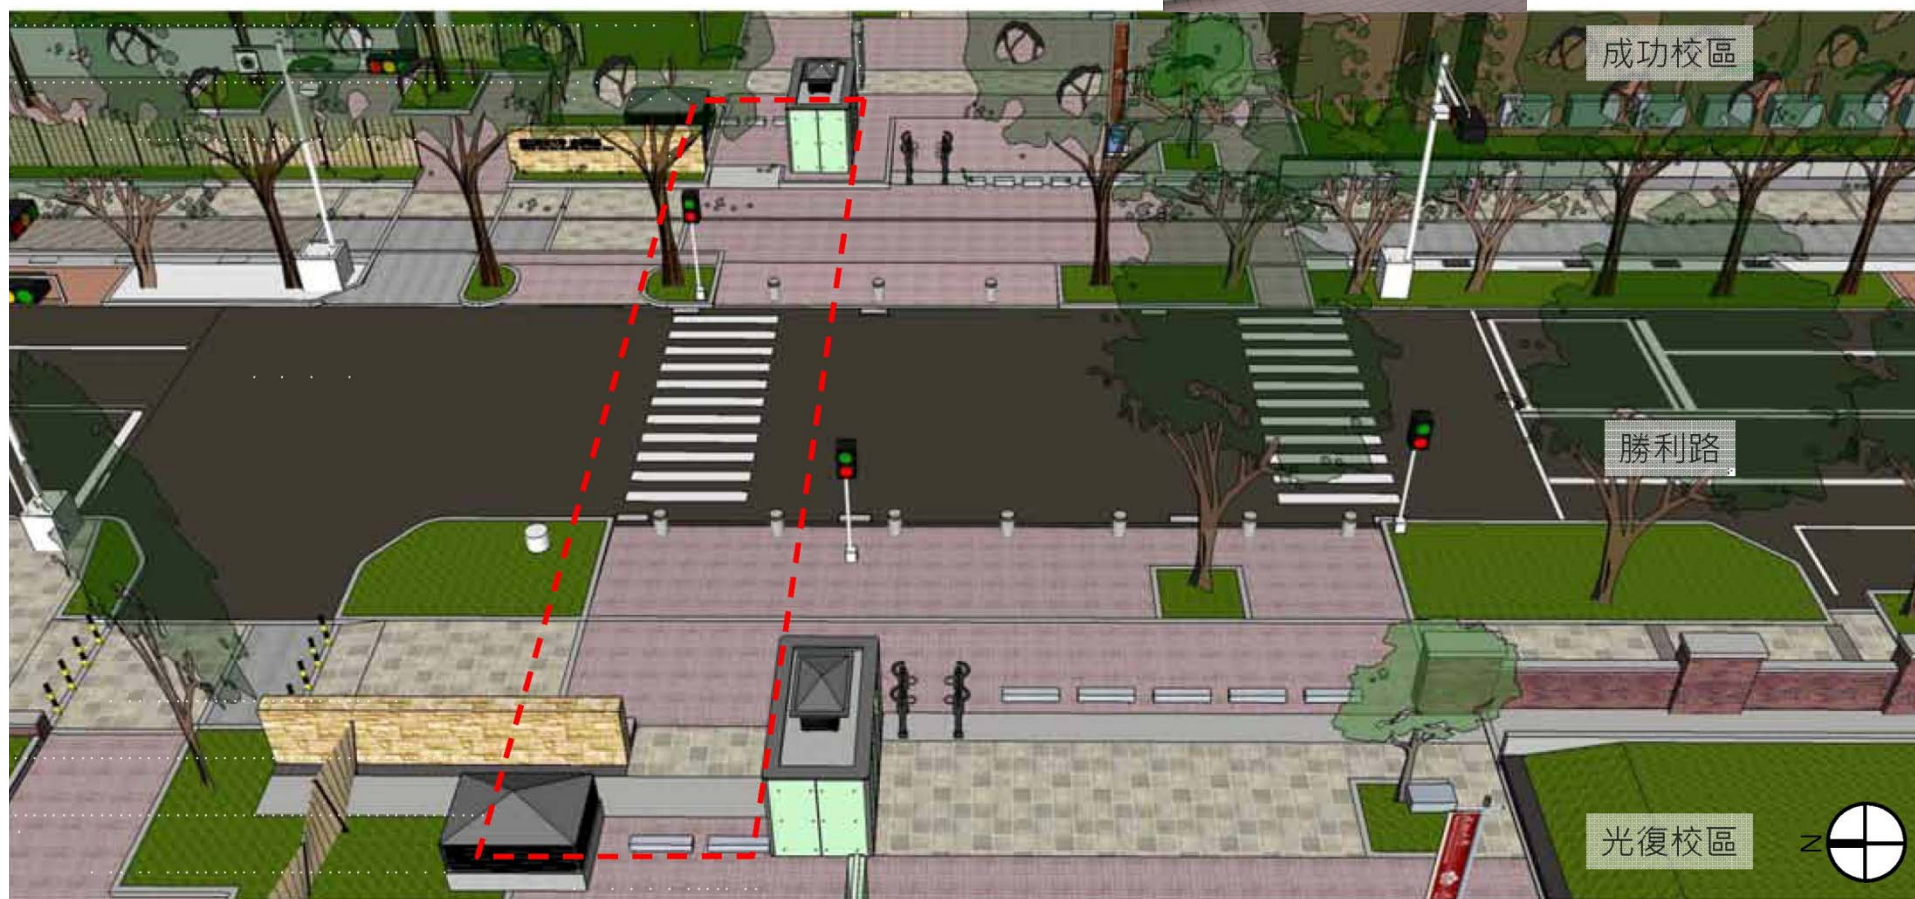


校園交通規劃--成功光復中軸自行車通行規劃



校園交通規劃---成功光復中軸自行車通行規劃

校園開放空間規劃工程說明

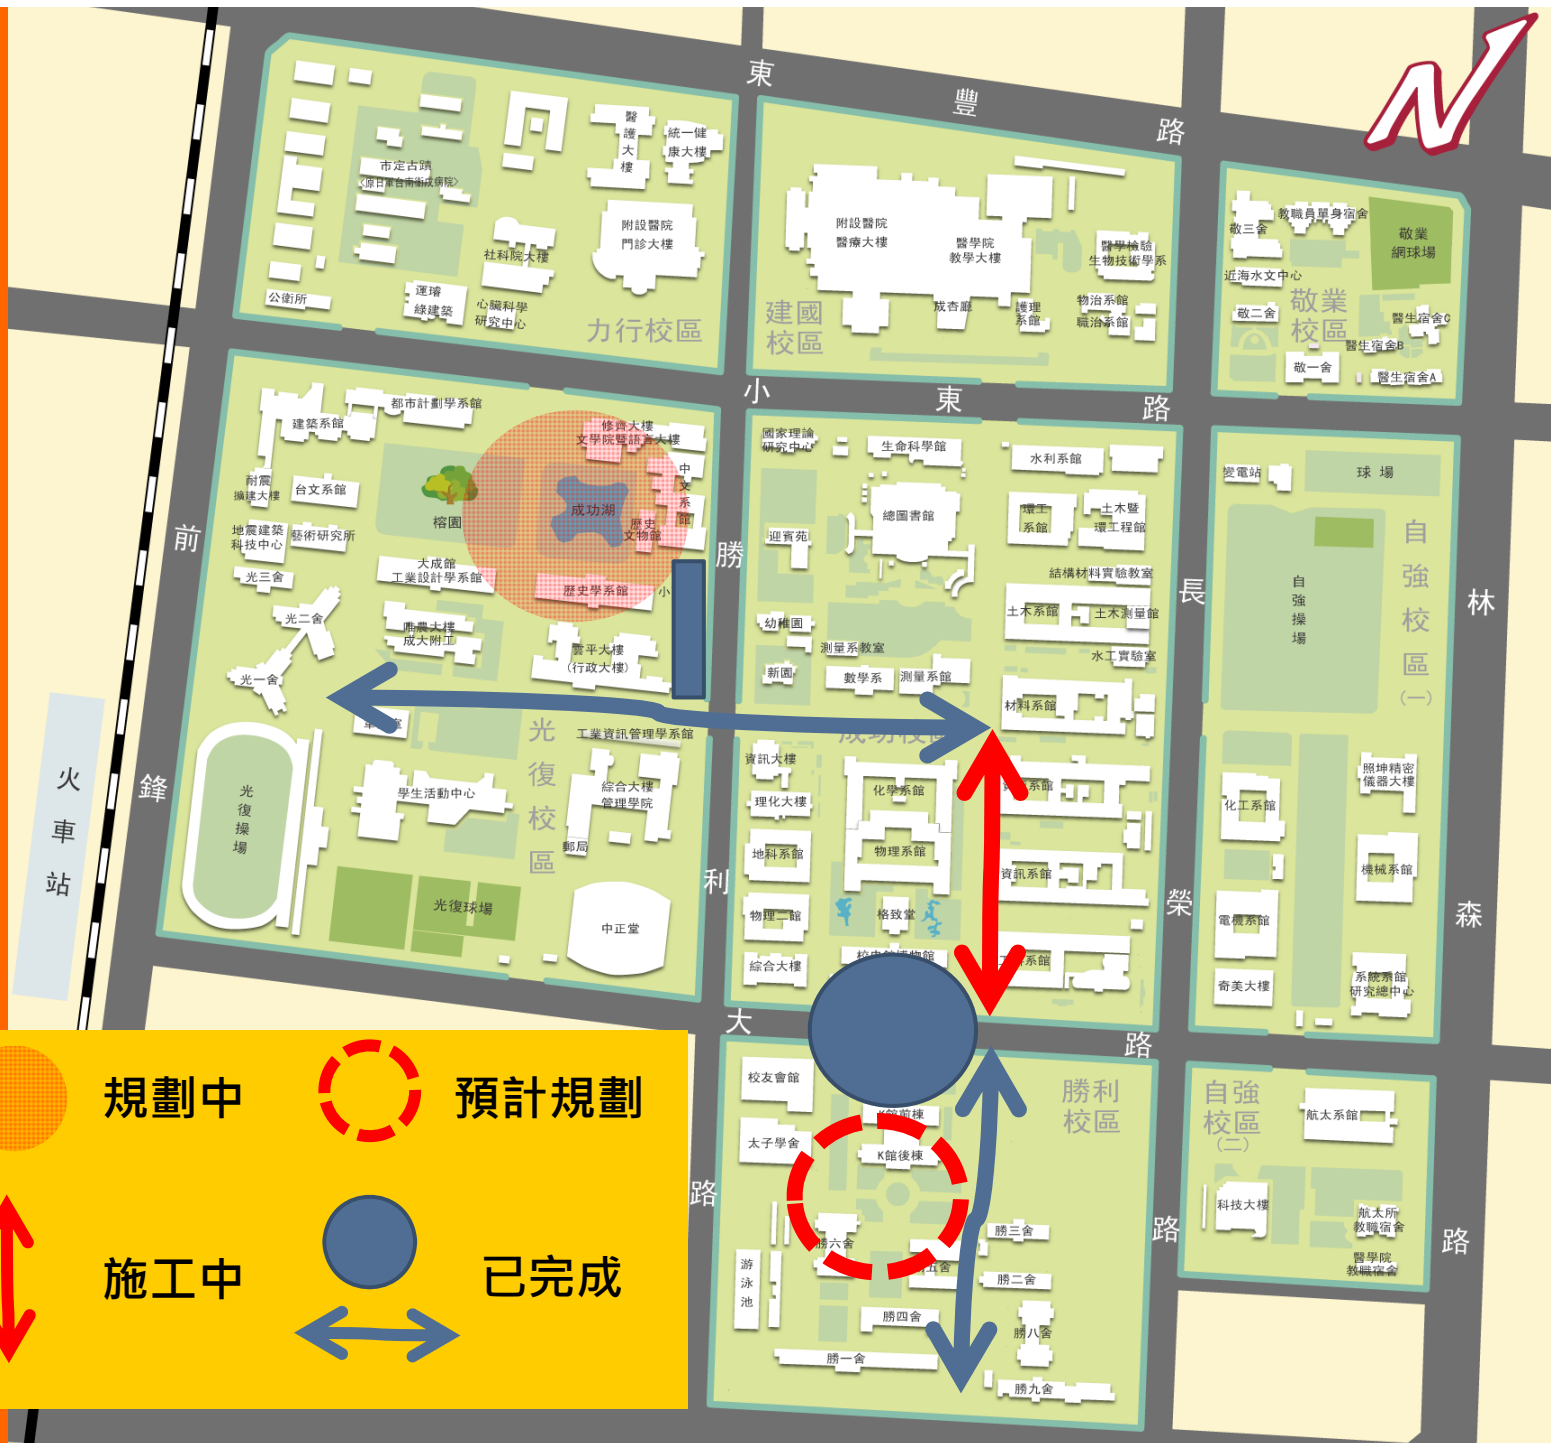



Thank for your listening
