



工學院大道

國立成功大學營繕工程說明

總務處 杜簡任技正 明河


營繕組 · 2013

校內重要工程說明表



項次	案名	進度	承辦人
1	成功校區東側教學舍後期更新整建工程(材料、資源及資訊三系館)	於101年11月30日舉行上樑典禮，其分項建築工程預定進度79%，實際進度76%。進行屋突結構及室外裝修工程。	徐家偉 李明容 高龍峻
2	數位設計教學大樓新建工程	基地既有管路遷移完成，目前整地中。	陳志明 黃品智
3	生物科技教學大樓新建工程	30%初步設計報告業於101年8月7日審查同意。目前設計書圖送臺南市政府進行都市設計審議作業中。	陳建邦 黃照仁
4	海工教學大樓新建工程	101年8月1日議約決標。102年3月1日30%初步設計報告書，由教育部轉工程會審議作業中。	吳易儒 王正雄
5	游泳池及球類場館新建工程	已完成議約，進行規劃設計中。	楊淑媚 戴正義
6	理學教學大樓新建工程	構想書及經費已核定；契約樣稿討論中。	賴俊允 莊輝明

成功校區東側教學舍後期更新整建工程 (材料、資源及資訊三系館)



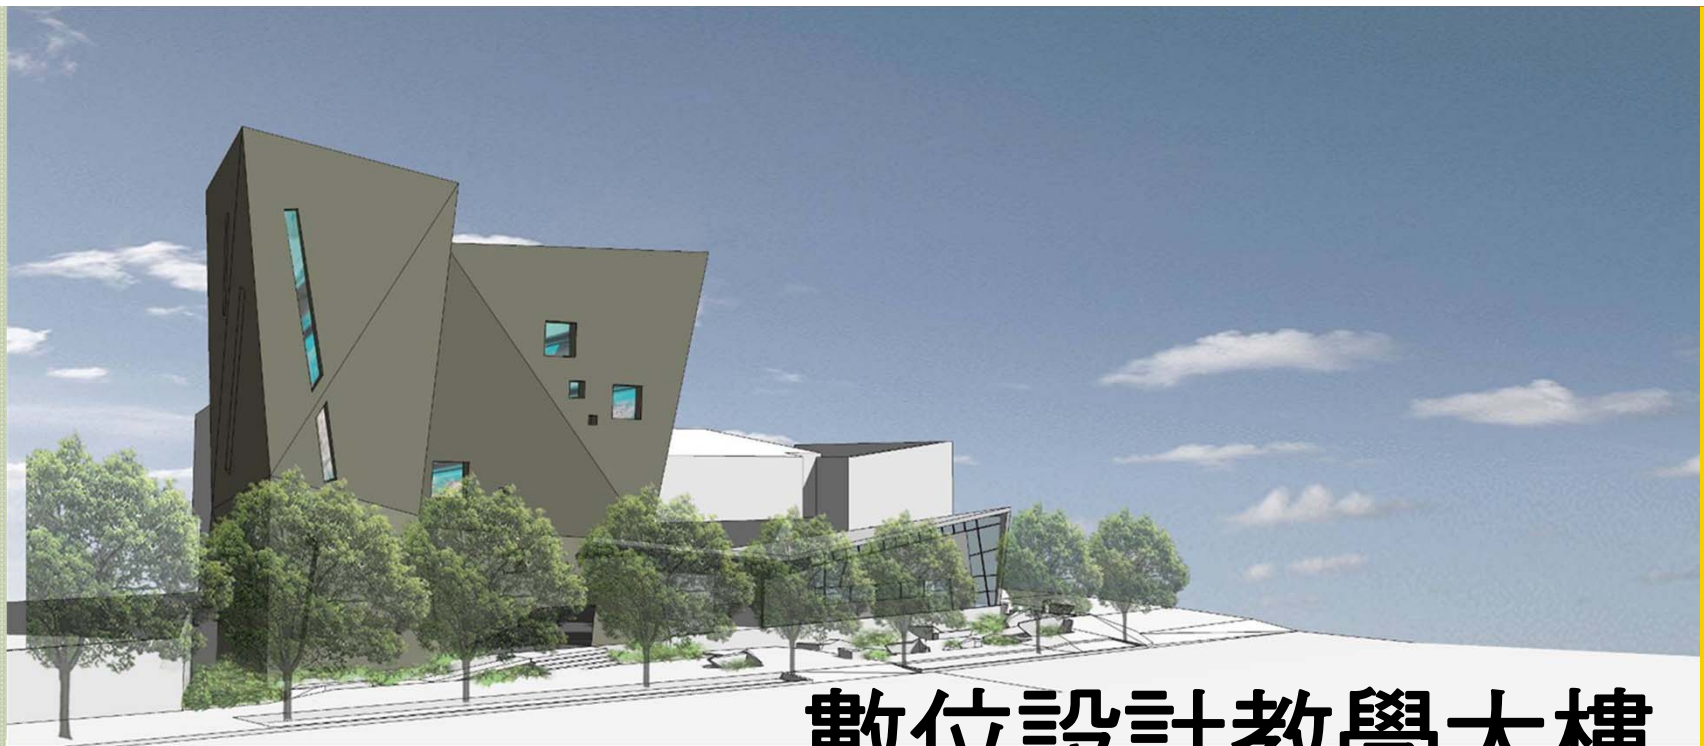

數位設計教學大樓

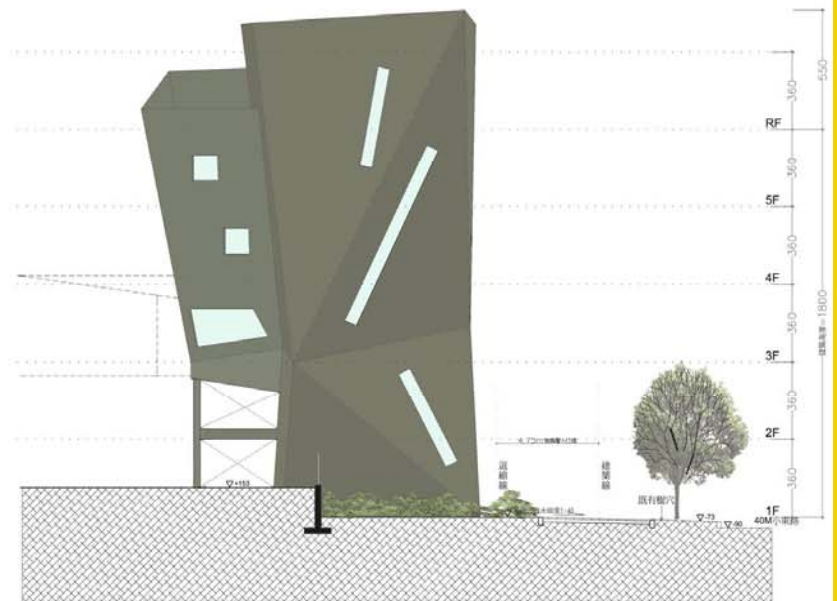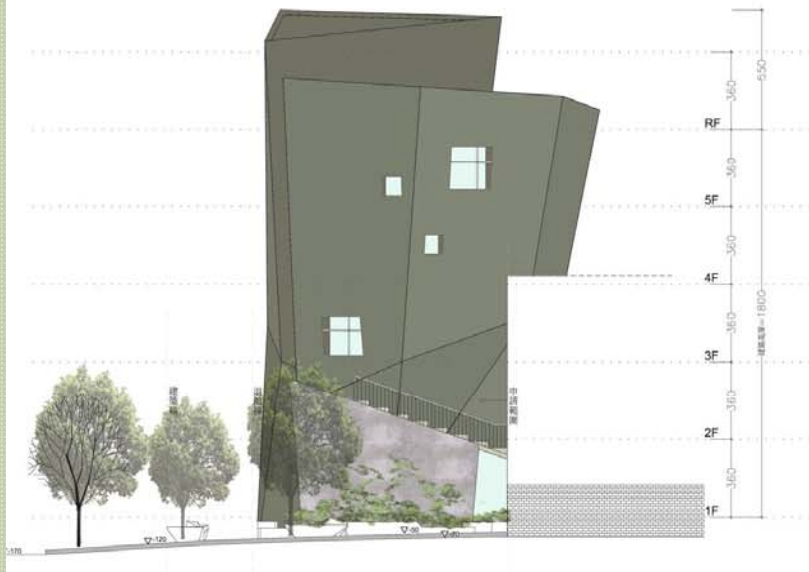



生物科技教學大樓

海工教學大樓新建工程



游泳池及球類場館新建工程



理學教學大樓新建工程量體模擬示意圖



校園開放空間及公共建築工程說明表

項次	案名	進度	承辦人
1	成功及勝利校區道路改善工程	預計4月17日開標。	楊順宇
2	工學大道排水系統整修工程	細部設計圖說繪製中，預計4月底提送。	徐家偉
3	小東門殘垣修復工程	截至3月底進度，預定進度25.657%，實際進度16.38%	徐家偉
4	市定古蹟原日軍台南衛戍病院講堂	已完工。	楊淑媚
5	格致堂屋頂整修工程委託規劃設計	細部設計中。	吳易儒
6	光二舍寢室及公共空間整修工程	二期工程已發包，預計9月中竣工。	賴俊允
7	中正堂周邊東側道路改善	建築師規劃中。	陳建邦
8	自強籃球場週邊排水與地面鋪整	調查規劃中。	葉家綺
9	校本部環境影響評估	4月9日完成評選，由光宇工程顧問有限公司取得優先議約權。	楊順宇
10	敬業網球場整修	發包簽辦中。	賴俊允
11	手術室整修工程	辦理結案中。	吳易儒

成功及勝利校區道路改善工程




成大工學路景觀設計



區域配置(以工科系、資訊系、資源系為例)



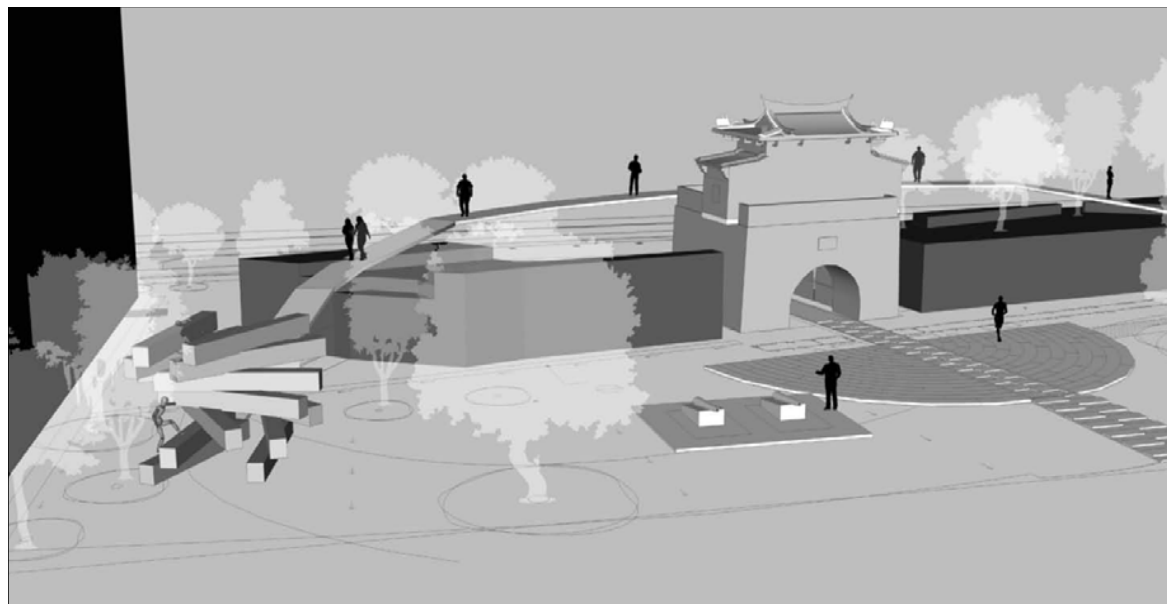

小東門殘垣修復工程





市定古蹟原日軍
台南衛戍病院講堂



光二舍寢室與公共空間整修（第二期）



寢室空間

針對已完成成果功能檢討加強



敬業網球場整修



衛戍病院手術室整修工程

已完工工程說明表-1

項次	案名	完工日期	承辦人
1	力行校區資源回收場鋪面及排水整繕工程	101年1月6日完工	賴俊允
2	核心實驗室儀器設備採購	101年1月14日完工	葉家綺
3	都市計畫系聯展工作坊實習教室整修工程	101年1月23日完工	徐家偉
4	東寧宿舍區停車場整繕(含圍籬設置)工程	101年1月30日完工	賴俊允
5	成功校區測量系館北側外牆整修工程	101年2月1日完工	劉昭慧
6	勝五舍及化學館供電備援工程	101年2月11日完工	黃品智
7	魔法學校生態園藝教學設施新建工程	101年2月25日完工	徐家偉
8	水工試驗所大型平面水池試驗鋼構油漆工程	101年3月13日完工	葉家綺
9	汰換光復校區南側高壓纜線工程	101年3月17日完工	黃品智
10	建築系屋頂防水工程	101年3月24日完工	陳建邦
11	理化大樓外牆磁磚整修工程	101年3月29日完工	陳建邦
12	台文、建築、工設系教學空間電力改善工程	101年4月23日完工	李明容


已完工工程說明表-2

項次	案名	完工日期	承辦人
13	數位設計教學大樓地質鑽探工程	101年4月27日完工	吳易儒
14	機械系外牆磁磚整修工程	101年5月8日完工	劉昭慧
15	化工系館屋頂空間衍架及安全防護網整修工程	101年5月19日完工	陳志明
16	儀器設備中心大樓微奈米中心實驗室空調增設工程	101年6月1日完工	高龍峻
17	規劃與設計學院協同駐校建築師創意實驗改造工程	101年6月10日完工	葉家綺
18	護理系館無障礙電梯新建及相關友善環境整修工程	101年6月15日完工	賴俊允
19	前瞻醫療器材科技中心整修工程	101年7月11日完工	陳建邦
20	工資管系東側污水設施及廁所整修工程	101年7月31日完工	葉家綺
21	研究總中心暨行政大樓中庭鋼架玻璃整修工程	101年8月20日完工	陳建邦
22	勝四舍及勝六舍冷氣設備電源增設工程	101年8月31日完工	黃照仁
23	焚化爐改為MRI設備空間結構體工程	101年9月5日完工	陳建邦
24	光二舍寢室及公共空間整修工程（第一期）	101年9月13日完工	賴俊允 莊輝明

已完工工程說明表-3

項次	案名	完工日期	承辦人
25	醫學中心基礎醫學大樓動物實驗室空間整修工程	101年9月16日完工	楊淑媚
26	綜合大樓耐震補強工程	101年9月27日完工	陳建邦
27	文學院外語中心超媒體語言學習室裝修工程	101年10月8日完工	黃品智
28	中正堂耐震補強工程	101年10月10日完工	陳建邦
29	歸仁校區衛星推進系統實驗室新建工程	101年10月12日完工	賴俊允
30	會計系講堂整修工程	101年10月17日完工	李明容
31	海洋生物及鯨豚研究中心周邊景觀整建工程	101年10月19日完工	劉昭慧
32	能策中心實驗室儀器設備搬遷組裝測試及裝修工程	101年10月23日完工	陳志明
33	綠建築多功能教室裝修工程	101年11月5日完工	徐家偉
34	成功校區格致堂東西側景觀及排水改善工程	101年11月19日完工	劉昭慧
35	藝術中心空間整修工程	101年11月19日完工	葉家綺
36	醫學檢驗生物技術學系電力增設工程	101年11月30日完工	莊輝明
37	自強南校區新增污水幹管暨路面改善工程	101年12月18日完工	黃品智
38	管理學院演講廳整修工程	102年2月8日完工	葉家綺

魔法學校生態園藝教學設施新建工程

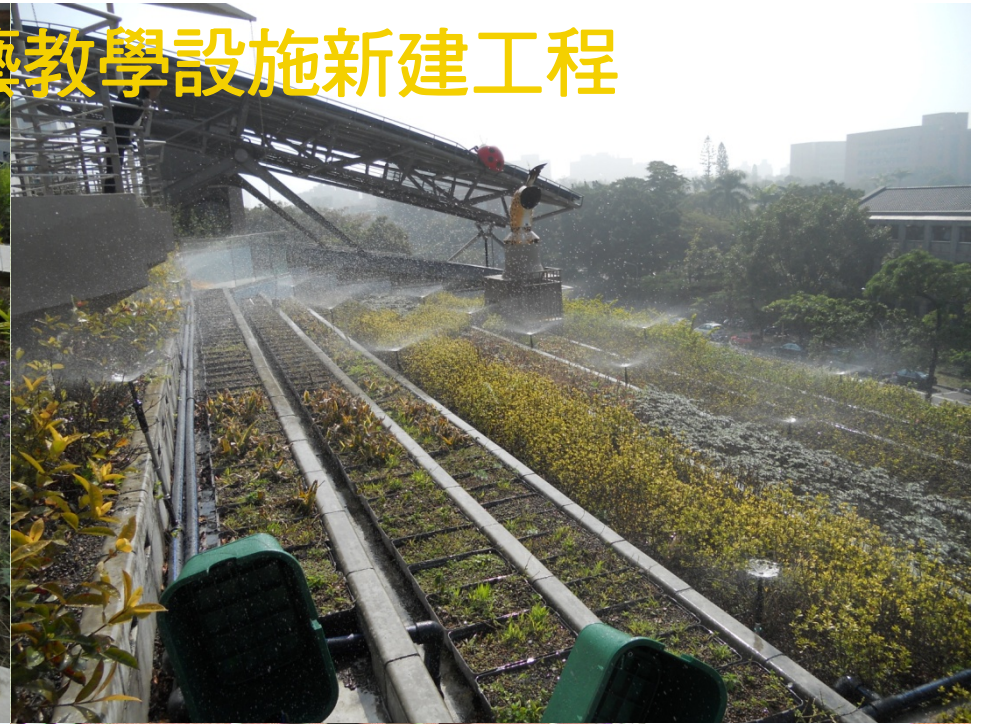

理化大樓外牆磁磚整修工程





焚化爐改爲MRI設備空間結構體工程▼



工程名稱：MRI設備空間裝修及機電工程
 監造單位：洪國峰建築師事務所
 承攬廠商：德泰營造有限公司
 施工地點：一樓停車場廣場
 查驗項目：平版磚
 查驗日期：
 查驗人員：



▲醫學中心基礎醫學大樓動物實驗室空間整修工程

文學院外語中心超媒體語言學習室裝修工程



歸仁校區衛星推進系統實驗室新建工程

海洋生物及鯨豚研究中心周邊景觀整建工程



成功校區格致堂東西側景觀及排水改善工程



規劃與設計學院偕同駐校建築師創意實驗改造工程



護理系館無障礙電梯新建及相關友善環境整修工程

會計系講堂整修工程





藝術中心空間整修工程



自強南校區新增污水幹管暨路面改善工程

管理學院演講廳整修工程

設計前



設計後



台文、建築、工設系教學空間電力改善工程



勝四舍及勝六舍冷氣設備電源增設工程



勝四舍



勝六舍



規劃設計作業說明表-1

項次	案名	進度	承辦人
1	國定古蹟工設系整修工程	已發包完成，待空間調度完成後施工。	葉家綺
2	臺南市市定古蹟原臺南高等工業學校校舍之格致堂修復工程	已完成技術服務委託評審，辦理設計作業中。	吳易儒
3	舊總圖耐震補強工程	已完成技術服務委託評審，辦理設計作業中。	陳建邦
4	資訊理化大樓耐震補強工程	洽辦技術服務委託作業中	陳建邦
5	芸青軒整修工程	細部設計作業中。	吳易儒
6	禮賢樓屋面及天花板緊急修復	發包預算已核定	賴俊允
7	禮賢樓整修	發包預算已核定	賴俊允
8	學生活動中心廁所整修	發包簽辦中。	葉家綺 戴正義
9	軍訓室屋頂漏水整修工程	已完成工程採購書圖簽辦。待取得經費，辦理採購公告。	葉家綺

規劃設計作業說明表-2

項次	案名	進度	承辦人
10	土木系結構材料實驗室屋頂滲漏水整修工程	已開工，預計6月中旬竣工。	賴俊允
11	航太系頂樓防水隔熱工程	已簽辦經費來源，預計102年4月10日公告。	吳易儒
12	化工系館外牆及屋頂防水隔熱整修工程	已完成工程採購書圖，待取得經費辦理採購公告。	陳志明



芸青軒整修工程



節能政策成效

類別	100年度1-11月	101年度1-11月	成效說明
用電部分	73,780,504 度	71,123,902 度	節約用電2,656,602度 節電成果顯著，惟因6月份起調漲電費，總計增加電費支出538萬5,584元。
用水部分	795,180 度	822,149 度	用水量增加29,969度 其增加水費支出約新台幣291,532元整。



成功大學校園未來展望

- | | |
|---------------|------|
| ∞ 體現生命價值與意義的 | 安全校園 |
| ∞ 共生共榮、尊重人權之 | 友善校園 |
| ∞ 落實節能減廢之綠環境 | 永續校園 |
| ∞ 致力於重現歷史紋理之 | 文化校園 |
| ∞ 提供適合學術活動產出之 | 創意校園 |
| ∞ 建構足以提高行政效能之 | 數位校園 |





Thank for your listening
